ArtiMano

Fiche de prise de cotes

Fenêtre 1/2

Cotes tableau et hors tout, équerrage, pose

AM-FENETRE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

COTES TABLEAU

entre maçonneries, en 3 points : on retient la plus petite

vue de l'intérieur

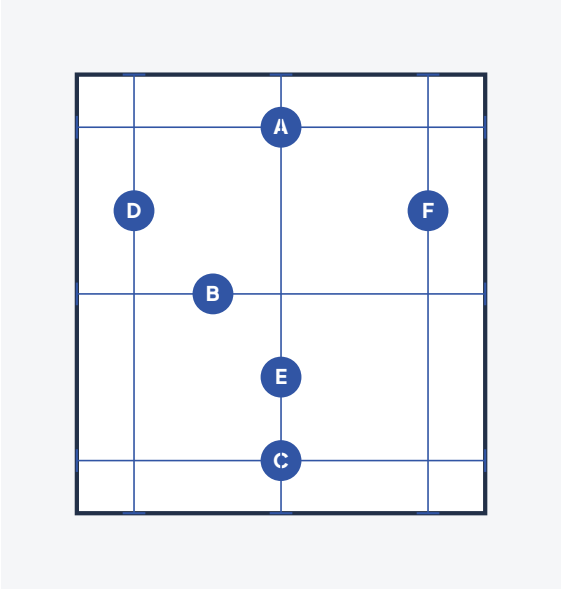

A	**Largeur en haut**	mm
B	**Largeur au milieu**	mm
C	**Largeur en bas**	mm
D	**Hauteur à gauche**	mm
E	**Hauteur au milieu**	mm
F	**Hauteur à droite**	mm
G	**Diagonale 1** haut gauche vers bas droit	mm
H	**Diagonale 2** haut droit vers bas gauche	mm

HORS TOUT ET AUTOUR DE LA FENÊTRE

J	**Largeur hors tout** extérieur du dormant existant	mm
K	**Hauteur hors tout** extérieur du dormant existant	mm
L	**Épaisseur du mur** embrasure, doublage compris	mm
M	**Allège** du sol fini au bas du tableau	mm
N	**Retombée de linteau** du haut du tableau au plafond	mm
P	**Écoinçon gauche** du tableau au mur de gauche	mm
Q	**Écoinçon droit** du tableau au mur de droite	mm
R	**Épaisseur du doublage** isolant et plaque, côté intérieur	mm

TYPE ET POSE

Élément ☐ fenêtre ☐ porte-fenêtre ☐ baie coulissante ☐ fenêtre de toit

Pose ☐ en tunnel ☐ en applique ☐ en feuillure ☐ en rénovation

Ouverture ☐ fixe ☐ à la française ☐ oscillo-battante ☐ coulissante

Vantaux ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 **Volet** ☐ aucun ☐ roulant ☐ battant

Mur ☐ brique ☐ parpaing ☐ pierre ☐ béton ☐ bois

Nombre de fenêtres identiques ___

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-FENETRE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Fenêtre 2/2
Feuillure, appui, aplombs, volet, vitrage, finitions

AM-FENETRE-B-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

FEUILLURE ET DORMANT EXISTANT
les lettres A, L et R renvoient à la page 1

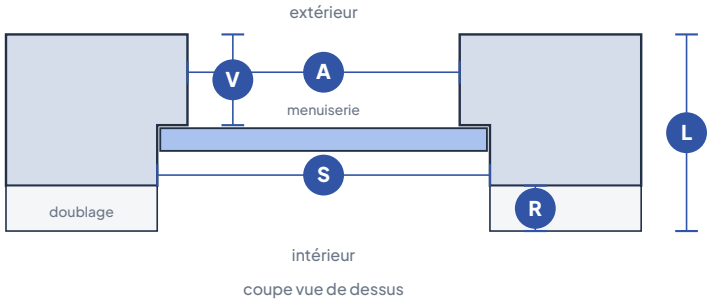

coupe vue de dessus

- **S** Largeur en fond de feuillure ___ mm
- **T** Hauteur en fond de feuillure ___ mm
- **U** Profondeur de la feuillure ___ mm
- **V** Profondeur du tableau extérieur — du nu extérieur à la feuillure ___ mm
- **W** Épaisseur du dormant existant ___ mm

APPUI, APLOMBS ET NIVEAUX
faux aplomb : écart mesuré au niveau sur la hauteur du tableau

- **X** Profondeur de l'appui ___ mm
- **Y** Hauteur du rejingot ___ mm
- **Z** Débord du nez d'appui ___ mm
- **AA** Largeur de l'appui — oreilles comprises ___ mm
- **AB** Faux aplomb à gauche ___ mm
- **AC** Faux aplomb à droite ___ mm
- **AD** Faux niveau de l'appui ___ mm
- **AE** Faux niveau du linteau ___ mm

VOLET ET COFFRE

- **AF** Hauteur du coffre ___ mm
- **AG** Profondeur du coffre ___ mm
- **AH** Largeur du coffre ___ mm
- **AJ** Hauteur de poignée souhaitée — depuis le sol fini ___ mm

Coffre ☐ tunnel ☐ intérieur ☐ extérieur ☐ bloc-baie ☐ aucun

Manœuvre ☐ électrique ☐ solaire ☐ sangle ☐ manivelle **Côté** ☐ gauche ☐ droite

MENUISERIE À POSER

Matériau ☐ PVC ☐ aluminium ☐ bois ☐ mixte bois-alu

Vitrage ☐ double ☐ triple ☐ feuilleté ☐ phonique ☐ dépoli

Petits bois ☐ oui ☐ non **Entrée d'air** ☐ oui ☐ non **Oscillo-battant** ☐ oui ☐ non

Dépose ☐ totale ☐ dormant conservé **Appui** ☐ pierre ☐ béton ☐ bois ☐ alu

Habillage ☐ tapées d'isolation ☐ couvre-joints ☐ bavette ☐ cornières

Accès ☐ rez-de-chaussée ☐ étage ☐ échafaudage ☐ nacelle

Couleur intérieure _____ Couleur extérieure _____ Quincaillerie _____

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Fenêtre de toit

Création ou remplacement : chevêtre, complexe de toiture, habi

AM-FENETRE-TOIT-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. FENÊTRE ET CHARPENTE

A **Largeur hors tout** — fenêtre existante ou souhaitée ____ mm

B **Hauteur hors tout** ____ mm

C **Largeur entre chevrons** ____ mm

D **Entraxe des chevrons** ____ mm

E **Hauteur des chevrons** — section du bois ____ mm

F **Épaisseur du complexe** — isolant et parement intérieur ____ mm

2. POSITION DANS LA PENTE

G **Allège** — du sol au bas de la fenêtre ____ mm

H **Hauteur du haut de fenêtre** — depuis le sol ____ mm

J **Distance au faîtage** — le long de la pente ____ mm

K **Distance à l'égout** — le long de la pente ____ mm

L **Pente du toit** ____ degrés

M **Profondeur de l'habillage** — côté intérieur ____ mm

3. TYPE ET ÉQUIPEMENT

Travaux ☐ création ☐ remplacement

Couverture ☐ tuile ☐ ardoise ☐ zinc ☐ bac acier

Ouverture ☐ par rotation ☐ par projection ☐ fixe

Manœuvre ☐ manuelle ☐ électrique ☐ solaire

Équipement ☐ volet roulant ☐ store occultant ☐ store extérieur

Chevêtre ☐ à créer ☐ existant

Habillage ☐ plaque de plâtre ☐ lambris ☐ kit du fabricant

4. QUANTITÉ

N **Fenêtres identiques** ____

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-FENETRE-TOIT-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Porte
Baie en 3 points, épaisseur de mur, sens d'ouverture

AM-PORTE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

DIMENSIONS DE LA BAIE
entre maçonneries, hauteurs depuis le sol fini

vue de l'intérieur

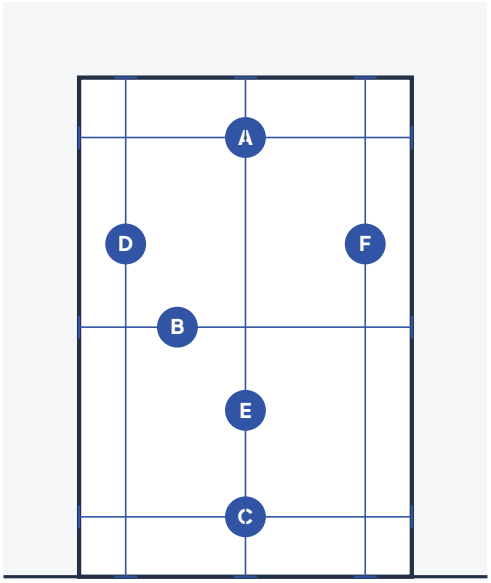

A	**Largeur en haut**	mm
B	**Largeur au milieu**	mm
C	**Largeur en bas**	mm
D	**Hauteur à gauche**	mm
E	**Hauteur au milieu**	mm
F	**Hauteur à droite**	mm
G	**Épaisseur du mur** doublages compris	mm
H	**Hauteur de seuil** 0 si aucun seuil	mm

AUTOUR DE LA PORTE

J	**Écoinçon côté paumelles** du bord de la baie au mur voisin	mm	K	**Écoinçon côté serrure** du bord de la baie au mur voisin	mm
L	**Retombée de linteau** du haut de la baie au plafond	mm	M	**Débattement libre** place disponible devant la porte	mm

TYPE ET SENS D'OUVERTURE

Type ☐ intérieure ☐ d'entrée ☐ de service ☐ de garage ☐ à galandage

Sens ☐ poussant droit ☐ poussant gauche ☐ tirant droit ☐ tirant gauche

Huisserie ☐ à conserver ☐ à remplacer ☐ à créer

Mur ☐ placo ☐ brique ☐ parpaing ☐ pierre ☐ béton ☐ bois

Sol fini ☐ oui ☐ non : prévoir l'épaisseur du revêtement

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-PORTE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano

Fiche de prise de cotes

Porte de garage

Baie, retombée de linteau, écoinçons, refoulement

AM-GARAGE-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. BAIE entre maçonneries, hauteurs depuis le sol fini

A	**Largeur en haut**	mm	D	**Hauteur à gauche**	mm
B	**Largeur au milieu**	mm	E	**Hauteur à droite**	mm
C	**Largeur en bas**	mm	F	**Épaisseur du mur**	mm

2. AUTOUR DE LA BAIE

G	**Retombée de linteau** du haut de la baie au plafond	mm	K	**Profondeur libre** refoulement sous plafond, sans obstacle	mm
H	**Écoinçon gauche**	mm	L	**Hauteur sous plafond**	mm
J	**Écoinçon droit**	mm	M	**Faux niveau du seuil**	mm

3. TYPE ET POSE

Type ☐ sectionnelle ☐ basculante ☐ enroulable ☐ battante ☐ coulissante latérale

Pose ☐ en applique intérieure ☐ en tunnel

Motorisation ☐ oui ☐ non

Prise ☐ à proximité ☐ à créer

Options ☐ portillon ☐ hublots ☐ isolation renforcée

Obstacles ☐ aucun ☐ poutre ☐ canalisation ☐ luminaire

Sol ☐ fini ☐ brut

Couleur _____ Finition _____ Remarque sur l'accès _____

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-GARAGE-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Volets
Battants, roulants ou coulissants : tableau, gonds, coffre

AM-VOLETS-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. TABLEAU entre maçonneries, côté extérieur

A	**Largeur en haut**	mm	D	**Hauteur à droite**	mm
B	**Largeur en bas**	mm	E	**Profondeur du tableau** du nu extérieur à la menuiserie	mm
C	**Hauteur à gauche**	mm	F	**Hauteur de l'appui** rejingot	mm

2. VOLETS BATTANTS hauteurs des gonds depuis l'appui

G	**Gond bas**	mm	K	**Écart du gond au tableau**	mm
H	**Gond du milieu**	mm	L	**Vantaux**	
J	**Gond haut**	mm	M	**Débattement libre** place pour ouvrir à 180°	mm

3. VOLETS ROULANTS

N	**Hauteur du coffre**	mm	Q	**Largeur des coulisses**	mm
P	**Profondeur du coffre**	mm	R	**Hauteur de linteau disponible**	mm

4. TYPE ET MANŒUVRE

Type ☐ battants ☐ roulants rénovation ☐ roulants traditionnels ☐ coulissants ☐ persiennes

Matériau ☐ bois ☐ aluminium ☐ PVC ☐ composite

Manœuvre ☐ manuelle ☐ électrique filaire ☐ radio ☐ solaire

Gonds ☐ conservés ☐ à sceller ☐ sur dormant

Côté ☐ commande à gauche ☐ commande à droite

5. QUANTITÉ

S **Volets identiques** ____

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

artimano.fr · modèle AM-VOLETS-v5 · les 4 carrés noirs doivent être visibles sur la photo

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Placard, dressing
Niche en 3 points, profondeurs, aplombs, obstacles

AM-PLACARD-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date __ __ / __ __ / __ __

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. NICHE
largeurs et hauteurs en 3 points : on retient la plus petite

A	Largeur en haut	mm	D	Hauteur à gauche	mm
B	Largeur au milieu	mm	E	Hauteur au milieu	mm
C	Largeur en bas	mm	F	Hauteur à droite	mm

2. PROFONDEUR ET FAUX APLOMBS

G	Profondeur à gauche	mm	L	Faux aplomb à gauche	mm
H	Profondeur à droite	mm	M	Faux aplomb à droite	mm
J	Hauteur de plinthe	mm	N	Faux niveau du sol	mm
K	Épaisseur de plinthe	mm	P	Retombée de poutre hauteur sous l'obstacle	mm

3. FAÇADE ET AMÉNAGEMENT

Façade ☐ coulissante ☐ battante ☐ pliante ☐ ouverte

Vantaux ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Intérieur ☐ penderie ☐ étagères ☐ tiroirs ☐ mixte

Fond ☐ mur brut ☐ panneau

Sol ☐ parquet ☐ carrelage ☐ moquette

Obstacles ☐ prise ☐ interrupteur ☐ radiateur ☐ trappe ☐ aucun

Décor ou teinte _____ Poignées _____ Éclairage _____

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.

ArtiMano
Fiche de prise de cotes

Garde-corps, rampe

Tronçons, hauteurs, pose et remplissage

AM-GARDE-CORPS-v5

Chantier _____ Client _____ Relevé par _____

Pièce / repère _____ Date ___ / ___ / ___

Cotes en mm · un chiffre par case · stylo noir

1. PLAN DES TRONÇONS vue de dessus, tronçons numérotés

2. TRONÇONS rampant : cochez la pente en remarque

N°	Longueur	Haut. de chute	N°	Longueur	Haut. de chute
1			5		
2			6		
3			7		
4			8		

3. COTES

- **A** **Hauteur souhaitée** — du sol fini à la main courante : ____ mm
- **B** **Épaisseur de la dalle** — au nez : ____ mm
- **C** **Largeur de l'escalier** : ____ mm
- **D** **Longueur du rampant** : ____ mm
- **E** **Pente de l'escalier** : ____ degrés
- **F** **Marches** : ____

4. POSE ET MATIÈRE

Pose	☐ sur dalle	☐ en nez de dalle	☐ entre murs	☐ sur muret
Remplissage	☐ barreaux	☐ verre	☐ câbles	☐ tôle
Matériau	☐ acier	☐ inox	☐ aluminium	☐ bois
Lieu	☐ intérieur	☐ extérieur		
Support	☐ béton	☐ bois	☐ métal	☐ pierre

CROQUIS LIBRE ET REMARQUES

Photographiez cette fiche dans ArtiMano : les cotes rejoignent le relevé du chantier, à vérifier puis à valider.
